




Восстановление электросетевого комплекса Приморского края

oboronenergo.su

18-19 ноября 2020 года, в результате ледяного дождя и мокрого снега, которые сопровождалось ветром со скоростью до 30 м/с, повреждено свыше 80% электросетей в г. Владивостоке и на острове Русский. Из 164 км воздушных сетей 120 км получили повреждения.

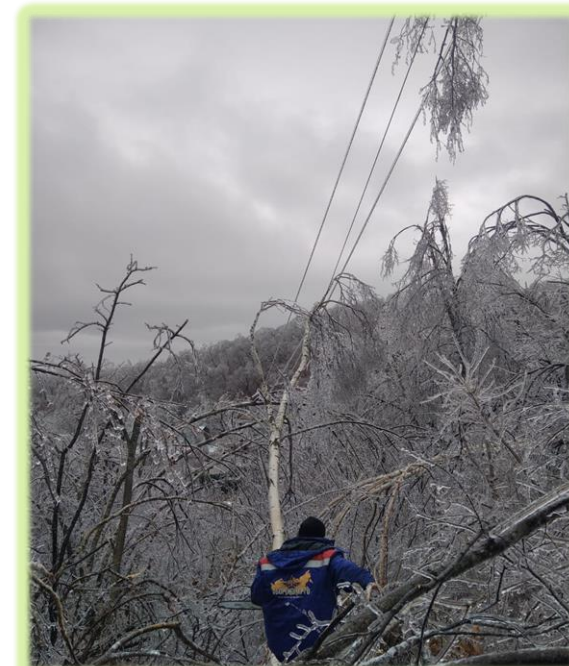

Общее количество отключенных потребителей в 12 населенных пунктах превысило 18 тысяч человек, мощность отключенных электроустановок составила 14,4 мегаватт. В устранении последствий стихийных явлений участвовало 99 человек, 17 бригад, 27 единиц спецтехники. Восстановлено 120 км линий электропередач, отремонтировано свыше 52 трансформаторных подстанций, расчищено 246 гектар трасс.

АО «Оборонэнерго» разработана программа повышения надежности электроснабжения потребителей Приморского края на 2021-2024 годы.

В период с 17 мая по 11 июня 2021 г., комиссией Управления Ростехнадзора проведена проверка филиала «Приморский», по результатам которой выявлены нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов.


Количество мероприятий, запланированных по итогам внеплановой проверки – 1618 шт. (по состоянию на 02.09.2021 выполнено 1377 (85,1 %)).

Помимо аварийно-восстановительных работ, в рамках подготовки филиала «Приморский» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022, дополнительно выполнены работы по ремонту 85 км линий электропередач классом напряжения 6/0,4 кВ, установлено 625 железобетонных опор, взамен деревянных, произведена замена голого провода на СИП. Заключены договора подряда для производства работ в г. Владивосток, г. Фокино, г. Уссурийск.





На о. Русский восстановлены кольцевые схемы электроснабжения линий электропередач 6 кВ (3 кольца) которые позволяют резервировать схему электроснабжения потребителей. Работы по реконструкции электросетевых объектов выполнены на 90 % от плана, выполнена замена опор, голого провода на изолированный в объеме 60 км, расчистка просек в объеме 30 гектар, замена 1 ТП, ремонт 3 ТП. Приобретено 2 единицы специализированной техники, бурильно-крановая машина МКМ-200 и многофункциональный трактор, создан необходимый аварийный запас материалов.

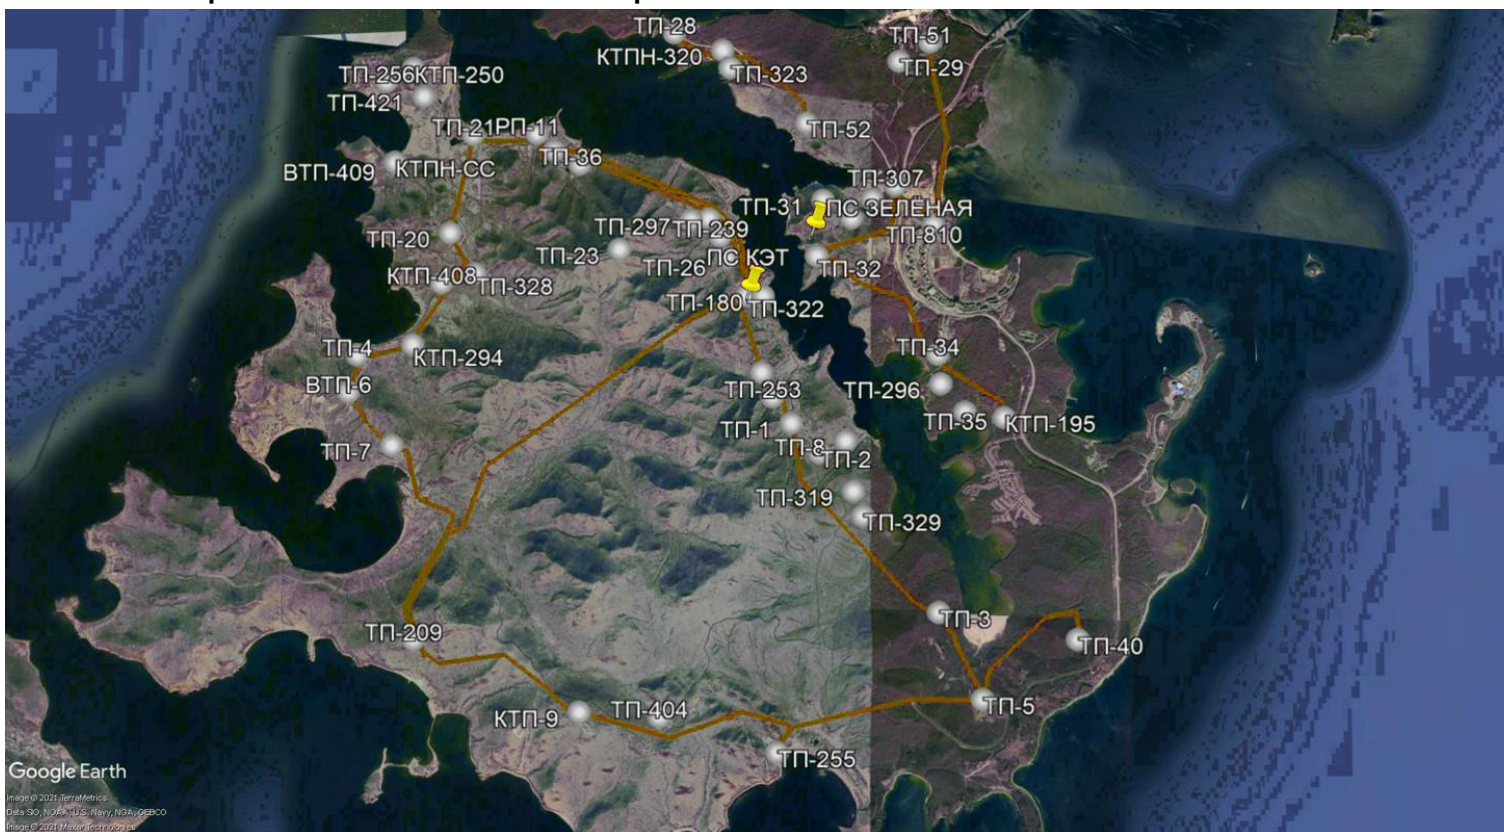



По программе текущего и капитального ремонта выполнены мероприятия на сумму 39,2 млн. руб. с НДС.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 03.09.2021

Наименование Филиала	План затрат на 2021 г., тыс. руб. с НДС	Выполнение на 03.09.2021 г., тыс. руб. с НДС	%
«Приморский»	27 756,072	22 482,420	81

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 03.09.2021

Наименование Филиала	План затрат на 2021 г., тыс. руб. с НДС	Выполнение на 03.09.2021 г., тыс. руб. с НДС	%
«Приморский»	20 405,688	16 732,664	82

Инвестиционной программой филиала «Приморский» предусмотрены мероприятия на общую сумму 311 млн. руб. с НДС, из них: 193 млн руб. с НДС тарифные источники, 118 млн. руб. с НДС мероприятия по технологическому присоединению. Программа реконструкции, модернизации и техперевооружения включает в себя работы на проблемных участках г. Владивосток: район бухты Щитовая, п. Рыбачий, район Эгершельд, бухты Улисс и Патрокл.

На сегодняшний день освоение денежных средств по инвестиционной программе составляет 261,99 млн. руб. с НДС. Выполнены работы по реконструкции электросетевых объектов, приобретены дизельные электрические станции и специализированная техника.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Приморского края и АО «Оборонэнерго» в полном объеме выполнены мероприятия по реконструкции электрических сетей о. Русский на сумму 57,6 млн. руб. с НДС.

По программе тех. присоединения построены и введены в эксплуатацию объекты электросетевого хозяйства для электроснабжения дет. садов № 1, 2 в микрорайоне Патрокл, детсада в посёлке Новонежино, РТП и КЛ-10 кВ в массиве «Синяя Сопка» для снятия ограничений по электроснабжению жилого микрорайона.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 03.09.2021 г.

п/п	Субъект РФ	План финансирования, млн. руб. (с НДС)	Факт финансирования, млн. руб. (с НДС)	Процент выполнения ИП, %
1	Приморский край	311,90	261,99	84



Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Приморского края электроустановки, обслуживаемые АО «Оборонэнерго», поддерживаются в состоянии эксплуатационной готовности. Организована работа круглосуточных оперативно-диспетчерских служб и оперативно-ремонтных бригад, производственные участки и районы электрических сетей обеспечены необходимой спецтехникой, эксплуатационным и аварийным резервом материалов и оборудования.

ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 03.09.2021 г.

Наименование филиала	Общий процент готовности	Подстанции 35 кВ и выше	Воздушные и кабельные линии электропередачи 0,4 - 20 кВ	Трансформаторные подстанции (ЗТП, КТП, МТП, РП) 6 - 20 кВ	Пополнение аварийного запаса
«Приморский»	81%	77%	74%	79%	77%

Мероприятия по программам капитального и текущего ремонта, а также инвестиционной программе будут выполнены до начала начала осенне-зимнего периода 2021 -2022 годов.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

