

№ 1205 от 23.08.17

Коммерческое предложение № 1205

Предлагаем поставку блок контейнеров на базе РосМодуль Север (производство г.Санкт-Петербург, Россия), максимальной заводской готовности по Вашей заявке.

п/п	Наименование, размеры	Количество, шт.	Цена в т.ч. НДС 18%, руб.шт.	Сумма в т.ч. НДС 18%, руб.
1.	Блок-контейнер №1 - ЗМУ РЭС-3 ТЗ КПП «РосМодуль» СЕВЕР (мебель и оборудование по т.з. заказчика.) 3,0х4,25х2,81 м	1 шт.		430 000,00
2.	Доставка Блок-контейнер №1 - ЗМУ РЭС-3 ТЗ п. Толвуя Медвежегорский р-н.	1 шт		99 000,00
3.	Блок-контейнер №2 - РПБ РЭС-1 ТЗ КПП «РосМодуль» СЕВЕР(мебель и оборудование по т.з. заказчика.) 3,0х6,0х2,81 м	1 шт		590 000,00
4.	Доставка Блок-контейнер №2 - РПБ РЭС-1 ТЗ КПП г. Петрозаводск ул. Пограничная.	1 шт		99 000,00
5	Блок-контейнер №3 - РПБ РЭС-2 ТЗ КПП «РосМодуль» СЕВЕР(мебель и оборудование по т.з. заказчика.) 3,0х6,0х2,81 м	1 шт		590 000,00
6	Доставка Блок-контейнер №3 - РПБ РЭС-2 ТЗ КПП г. Олонец пер. Партизанский.	1 шт		65 000,00
7	Блок-контейнер №4 - РПБ РЭС-3 ТЗ КПП «РосМодуль» СЕВЕР(мебель и оборудование по т.з. заказчика.) 3,0х6,0х2,81 м	1 шт		590 000,00
8.	Доставка Блок-контейнер №4 - РПБ РЭС-3 ТЗ КПП Медвежегорск ул. Урицкого	1 шт		99 000,00
9.	Блок-контейнер №5 - РПБ СПС ТЗ КПП «РосМодуль» СЕВЕР(мебель и оборудование по т.з. заказчика.) 3,0х6,0х2,81 м	1 шт		490 000,00
	Доставка Блок-контейнер №5 - РПБ СПС ТЗ КПП г. Петрозаводск пр. Высотный	1 шт		90 000,00
	Итого:			3 142 000,00


Срок поставки – 45 рабочих дней.

Условия оплаты - 1. Аванс 70 % от стоимости договора ,40% после уведомления о готовности контейнеров к поставке.

1. Внутренняя высота потолка 2,40 м, внешняя 2,61 м, толщина стен 195...220 мм.
2. Стальной горячекатанный швеллер 12П, горячекатанный угловой профиль 80х6 мм, стяжки рам из углового профиля 32х32 мм.
3. Усиление каркаса контейнера: дополнительные стяжки из швеллера 120х50х3 мм - 2 шт. (с шагом 3 м), раскосы на углах - 16 шт. Нижний швеллер каркаса усилен продольным профилем 32х32 мм.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ю.В. Румянцев

4. Контейнерные углы: из замкнутого сварного профиля с проушинами для погрузки – 4 шт. Проушины выполнены из стального листа толщиной не менее 5 мм с квадратными отверстиями размерами 52x52 мм. Отверстия в проушинах закрываются пластиковыми заглушками К60/ЗБ – 4 шт.
 5. Наружная обшивка стен контейнера – Профлист с полимерным покрытием С-8, толщиной 0,7 мм, RAL 5005 или RAL 7004 или RAL 9002. Листы закреплены кровельными шурупами с изоляционными прокладками.
 6. Каркас стен трёхслойный: брус 100x40 мм, брус 50x50 внутри, доска 100x25 мм снаружи для вентиляционного зазора и жёсткости стен.
 7. Наружные фасонные элементы: гнутые короба и отливы из металлического окрашенного листа 0,5 мм.
 8. Теплоизоляция: стены - КНАУФ Термоплита 037 толщиной 150 мм + пенофол фольгированный 3-5 мм, пол и потолок - КНАУФ Терморолл 044 толщиной 150 мм + пенофол фольгированный 3-5 мм.
Сопротивление теплопередаче стен 5,027 м²оС/Вт, пола 4,922 м²оС/Вт, кровли 5,027 м²оС/Вт.
 9. Ветрозащита: типа Изоспан А
 10. Пароизоляция: пароизоляционная плёнка стены, п/э пленка потолок.
 11. Внутренняя отделка стен – ЛДСП 8 мм цвет бук, раскладка алюминиевый профиль RAL9002.
 12. Внутренняя отделка потолка – ЛДСП 8 мм цвет белая.
 13. Конструкция пола:
- металлическое дно контейнера снизу оцинкованный профлист С-8, 0,4 мм;
- лаги швеллер 100x50x3 мм;
- покрытие ЦСП 16 по обрешётке из доски 25 мм.
 14. Покрытие пола – линолеум п/к Таркет, плинтуса пластиковые.
 15. Окно Металлопластиковые, поворотно-откидные, двухкамерные (рама из профиля створки LL61/D) – 1 шт. Размер окна 900x1100 мм. Откосы окна из стального гнутого и окрашенного листа толщиной 0,5 мм снаружи контейнера.
 16. Входная дверь – Металлические двухлистовые 2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 8017 коричневый, два контура утепления. – 1 шт.
- Крыша контейнера: Не ржавеющая кровля, покрытая двумя оцинкованными стальными листами 6,0x1,25 м толщиной 0,5 мм с двойным фальцевым соединением вдоль контейнера и гидроизоляцией. Скат кровли 30 мм.

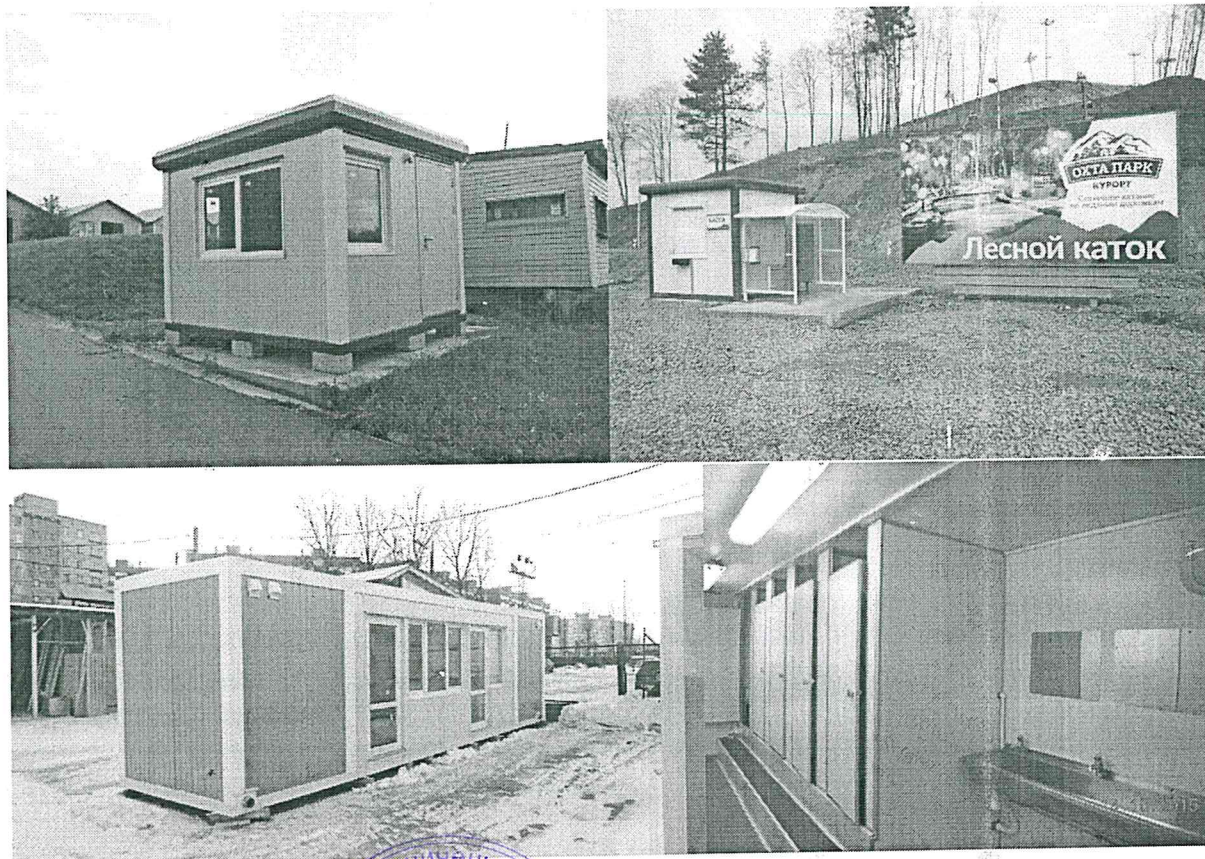

Менеджер вашего проекта
Потехин Л.И., менеджер Отдела Сбыта ООО «Росмодуль»:
Моб. Тел: +7 9531590801
Тел. +7 (812) 741-34-56
E-mail: potehin@zavodmz.ru



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ю. В. РУМЯНЦЕВ
